




ESTENSIONE RETE IDRICA LUNGO VIA BARGELLO - COMUNE DI CASTENASO (BO)

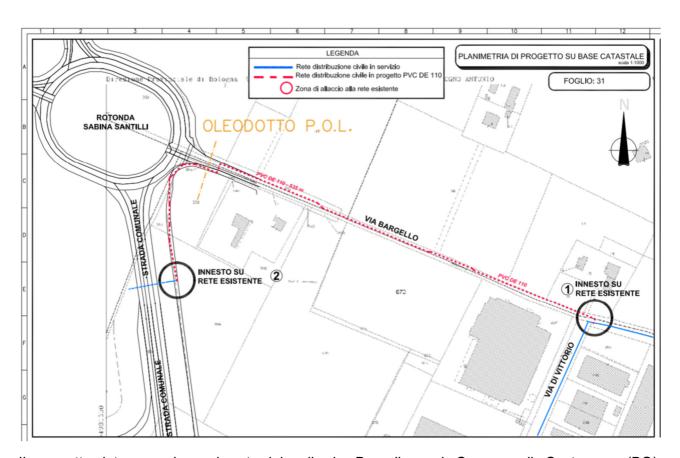

Il progetto interessa la sede stradale di via Bargello, nel Comune di Castenaso (BO), geograficamente compreso all'interno del foglio n. 221063 del quadro di unione della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 e del foglio castale n.31.

Il presente progetto è volto all'estensione della rete idrica in Via Bargello, partendo dall'incrocio con via Giuseppe di Vittorio, per poi proseguire, all'altezza della Rotonda Sabina Santilli, lungo la via ciclopedonale in direzione Sud fino ad intercettare la rete esistente.

L'intervento relativo alla condotta idrica si sviluppa per una lunghezza di circa 535 metri su sede stradale lungo via Bargello e lungo la ciclopedonale con posa di una condotta PVC DE 110.

DATA PREVISTA INIZIO LAVORI: 27/10/2025 ------ DATA PREVISTA FINE LAVORI: 23/12/25

INDICAZIONI PRELIMINARI PER RICHIESTA DI ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'



FASE 1 - descrizione:

predisposizione innesto rete in servizio con rete di progetto + avvio realizzazione nuova condotta.



Durata stimata: 1 SETTIMANA

7 giorni calendario e/o 5 giorni lavorativi effettivi! A fine lavori l'incocio sarà completamente ripristinato al traffico.

PRESCRIZIONI RICHIESTE

Via Bargello:

 per chi proviene da Est ("CENTRO")
 STRADA CHIUSA all'intesezione con Via di Vittorio.

Eventuale opzione traffico regolato da movieri valutabile solo in corso d'opera.

• per chi proviene da Ovest ("Rotonda Santilli")

OBBLIGO SVOLTA DX su Via di Vittorio

Via di Vittorio:

 per chi proviene da Sud in direzione Via Bargello, STRADA SENZA USCITA.
 Percorribile solo per chi proviene da Via Bargello direzione Ovest ("Rotonda Santilli").

OPZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PER
AREA SERVIZI CANTIERE E DEPOSITO MATERIALI

FASE 2 – descrizione:

realizzazione rete di progetto + predisposizione per successivi attraversamenti e allacci.



28 giorni calendario e/o 20 giorni lavorativi effettivi! A fine lavori la corsia sarà completamente ripristinato al traffico.

PRESCRIZIONI RICHIESTE

Via Bargello:

 Chiusura della "corsia nord", quindi solo per chi proviene da Est ("CENTRO"), dall'intesezione con Via di Vittorio fino alla Rotonda Santilli.

DIVIETO DI ACCESSO – SENSO VIETATO.

- La "corsia sud" sarà percorribile a senso unico solo per chi proviene da Ovest ("Rotonda Santilli")
- Ai veicoli (anche mezzi pesanti, autoarticolati e autotreni) in entrata e in uscita dalla travesa del civico 27 "Baschieri & Pellagri S.p.A." (e/o Castenaso lag - Italian Ammunition Group S.R.L.), sarà garantito l'attraversamento per l'mmissione in "corsia sud" con percorrenza a senso unico in direzione CENTRO. Tale disposizione andra comunicata direttamente agli uffici e ai soggetti interessati.



OPZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PER AREA SERVIZI CANTIERE E DEPOSITO MATERIALI

FASE 3 – descrizione:

predisposizione innesto rete in servizio con rete di progetto + realizzazione attraversamento e innesto al tronco già realizzato in precedente fase 2.



21 giorni calendario e/o 15 giorni lavorativi effettivi! A fine lavori la pista ciclabile e la corsia saranno completamente ripristinati al traffico.

PRESCRIZIONI RICHIESTE

Rotonda Santilli:

 Chiusura uscita Via Bargello, quindi solo per chi proviene in direzione "CENTRO" DIVIETO DI ACCESSO – SENSO VIETATO.

Via Bargello:

 Chiusura della "corsia sud", quindi solo per chi proviene da Ovest, ovvero all'intesezione Rotonda Santilli.
 DIVIETO DI ACCESSO – SENSO VIETATO.

Percorso CicloPedonale Via del Lavoro - Via Bargello:

 CHIUSURA – INTEDIZIONE AL TRANSITO PEDONALE E CICLABILE.

OPZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PER
AREA SERVIZI CANTIERE E DEPOSITO MATERIALI

